



# COMUNE DI PETROSINO

PROVINCIA DI TRAPANI

C.A.P.91020C.F.82007940818PartitaIVA00584590814

## PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE NELLA PARTE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

Committente: Dott. Gaspare Giacalone Sindaco pro-tempore Comune di Petrosino  
Piazza della Repubblica - 91020 Petrosino

**CRONOPROGRAMMA**

**EL  
07**


	Committente IL SINDACO Dott. Gaspare Giacalone	Il Progettista Arch. Vito Laudicina
<b>Data</b> 04 Febbraio 2019	_____ IL DD.LL.	ILRUP Ing. Vincenzo Tumbarello

DURATA (gg)

N. ord.	Voce Computo	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
---------	--------------	----------	--------	------	------------

1		Consegna dei lavori	03/09/2018	03/09/2018	0
2		Preparazione cantiere	03/09/2018	04/09/2018	1
3	1.1.6.1	Inizio effettivo dei lavori - Scavo a sezione obbligata	05/09/2018	08/09/2018	3
4	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate lato sud-Est	06/09/2018	07/09/2018	1
5	3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento lato sud est	10/09/2018	11/09/2018	1
6	3.2.1.4	Conglomerato cementizio per strutture fondazioni pilastri lato	10/09/2018	13/09/2018	3
7	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata	10/09/2018	13/09/2018	3
8	2.1.2	Muratura in blocchi di cemento pomice lato sud Est	13/09/2018	18/09/2018	5
9	3.1.1.4	Conglome cementiz strutture non armate lato sud-Ovest	17/09/2018	18/09/2018	1
10	3.2.2	Casseforme per strutture in cemento lato sud Ovest	18/09/2018	19/09/2018	1
11	3.2.1.4	Conglomerato cementizio fondazioni pilastri lato Sud Ovest	19/09/2018	22/09/2018	3
12	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Lato Sud Ovest	19/09/2018	22/09/2018	3
13	2.1.2	Muratura in blocchi di cemento pomice lato sud Ovest	24/09/2018	29/09/2018	5
14	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate lato Nord _	29/09/2018	30/09/2018	1
15	3.2.2	Casseforme per strutture in cemento lato Nord_Ovest	01/10/2018	02/10/2018	1
16	3.2.1.4	Conglomerato cementizio per strutture fondazioni pilastri lato Nord_Ovest	02/10/2018	07/10/2018	5
17	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata	02/10/2018	07/10/2018	5
18	2.1.2	Muratura in blocchi di cemento pomice lato Nord Ovest	07/10/2018	14/10/2018	7
19	3.2.1.4	Conglomerato cementizio per Cordolo di coronamento	08/10/2018	18/10/2018	10
20	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata	08/10/2018	18/10/2018	10
21	9.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo	15/10/2018	30/10/2018	15
22	9.1.9.1	Strato di finitura intonaco tipo Li Vigni	30/10/2018	02/11/2018	3
23	10.1.1.2	Fornitura Lastre di marmo	02/11/2018	05/11/2018	3
24	7.1.3	Posa opere in ferro	05/11/2018	06/11/2018	1
25	2.3.1.2	Vespaio e strato di cemento di livellamento	05/11/2018	08/11/2018	3
26		Pulizie e smobilizzo	08/11/2018	10/11/2018	2
27		Fine lavori	10/11/2018	10/11/2018	0

0 30 60 90 120 150

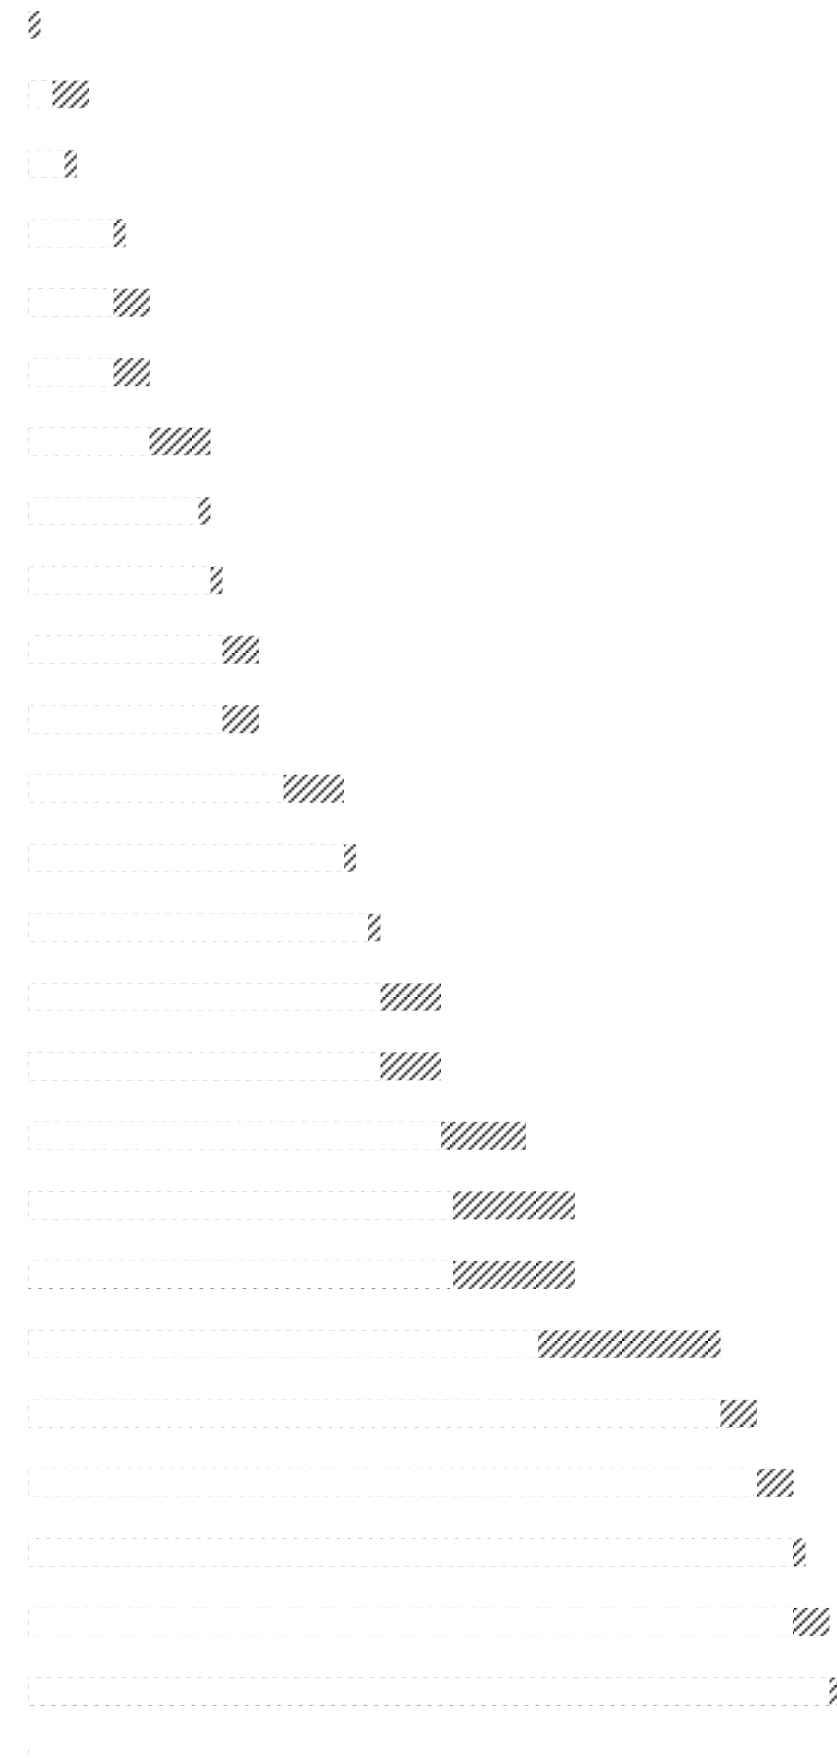

TC

68 gg.  
naturali consecutivi

[ ] gg

Fine lavori  
68 gg
